


Załącznik Nr II.1 - Harmonogram.mpp

Id.	Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	20-gru-30							20-sty-06							20-sty-13							20-sty-20							20-sty-27						
						w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	
1		Prace budowlane	109 dn?	śro, 20-01-01	sob, 20-05-30																																			
2		Składowisko	22 dn	pon, 20-02-1	wto, 20-03-17																																			
3		Waga 4	22 dn	pon, 20-02-1	wto, 20-03-17																																			
4		Waga 6	22 dn	pon, 20-02-1	wto, 20-03-17																																			
5		Waga 10	22 dn	pon, 20-02-1	wto, 20-03-17																																			
6		Brama 4	57 dn	pon, 20-01-2	wto, 20-04-07																																			
7		Brama 4	57 dn	pon, 20-01-2	wto, 20-04-07																																			
8		Zbiorniki popiołowe	27 dn	pon, 20-03-02	wto, 20-04-07																																			
9		Brama 5	73 dn	pon, 20-01-2	śro, 20-04-29																																			
10		Brama 5	73 dn	pon, 20-01-2	śro, 20-04-29																																			
11		Zbiorniki popiołowe	28 dn	pon, 20-03-23	śro, 20-04-29																																			
12		Magazyn M5	28 dn	pon, 20-03-2	śro, 20-04-29																																			
13		Waga 7	28 dn	pon, 20-03-2	śro, 20-04-29																																			
14		Parking	87 dn	pon, 20-01-2	wto, 20-05-19																																			

- Krytyczne
- Podział krytyczny
- Postęp krytyczny
- Zadanie
- Podział
- Postęp zadania
- Zadanie ręczne
- Tylko z rozpoczęciem
- Tylko z zakończeniem
- Tylko z czasem trwania
- Plan bazowy
- Podział według planu bazowego
- Punkt kontrolny według planu bazowego
- Punkt kontrolny
- Postęp sumaryczny
- Podsumowanie
- Podsumowanie ręczne
- Podsumowanie projektu
- Zadania zewnętrzne
- Zewnętrzne punkty kontrolne
- Zadanie nieaktywne
- Nieaktywny punkt kontrolny
- Podsumowanie nieaktywne
- Termin ostateczny

Załącznik Nr II.1 - Harmonogram.mpp

c | p | s | n
20-lut-03
p | w | ś | c | p | s | n
20-lut-10
p | w | ś | c | p | s | n
20-lut-17
p | w | ś | c | p | s | n
20-lut-24
p | w | ś | c | p | s | n
20-mar-02
p | w | ś | c | p | s | n
20-mar-09
p | w | ś | c | p | s | n
20-mar-16
p | w | ś | c | p | s | n
20-mar-23
p | w | ś | c | p | s | n
20-mar

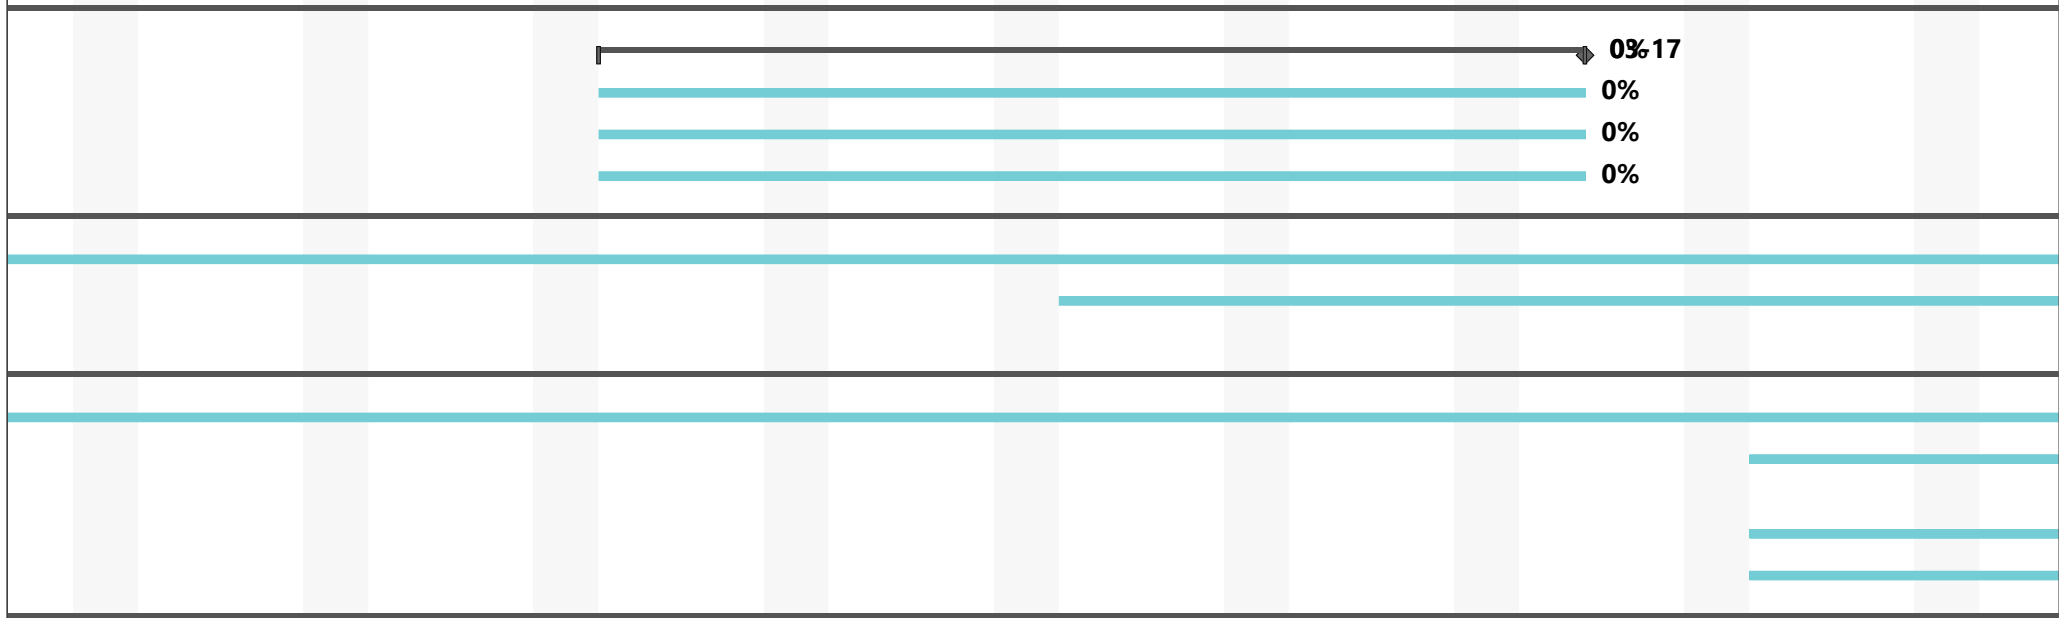


Krytyczne		Punkt kontrolny według planu bazowego	
Podział krytyczny		Punkt kontrolny	
Postęp krytyczny		Postęp sumaryczny	
Zadanie		Podsumowanie	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Postęp zadania		Podsumowanie projektu	
Zadanie ręczne		Zadania zewnętrzne	
Tylko z rozpoczęciem		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Tylko z zakończeniem		Zadanie nieaktywne	
Tylko z czasem trwania		Nieaktywny punkt kontrolny	
Plan bazowy		Podsumowanie nieaktywne	
Podział według planu bazowego		Termin ostateczny	

Załącznik Nr II.1 - Harmonogram.mpp

c | p | s | n | 20-lut-03 | 20-lut-10 | 20-lut-17 | 20-lut-24 | 20-mar-02 | 20-mar-09 | 20-mar-16 | 20-mar-23 | 20-mar-30

Krytyczne		Punkt kontrolny według planu bazowego	
Podział krytyczny		Punkt kontrolny	
Postęp krytyczny		Postęp sumaryczny	
Zadanie		Podsumowanie	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Postęp zadania		Podsumowanie projektu	
Zadanie ręczne		Zadania zewnętrzne	
Tylko z rozpoczęciem		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Tylko z zakończeniem		Zadanie nieaktywne	
Tylko z czasem trwania		Nieaktywny punkt kontrolny	
Plan bazowy		Podsumowanie nieaktywne	
Podział według planu bazowego		Termin ostateczny	

Załącznik Nr II.1 - Harmonogram.mpp

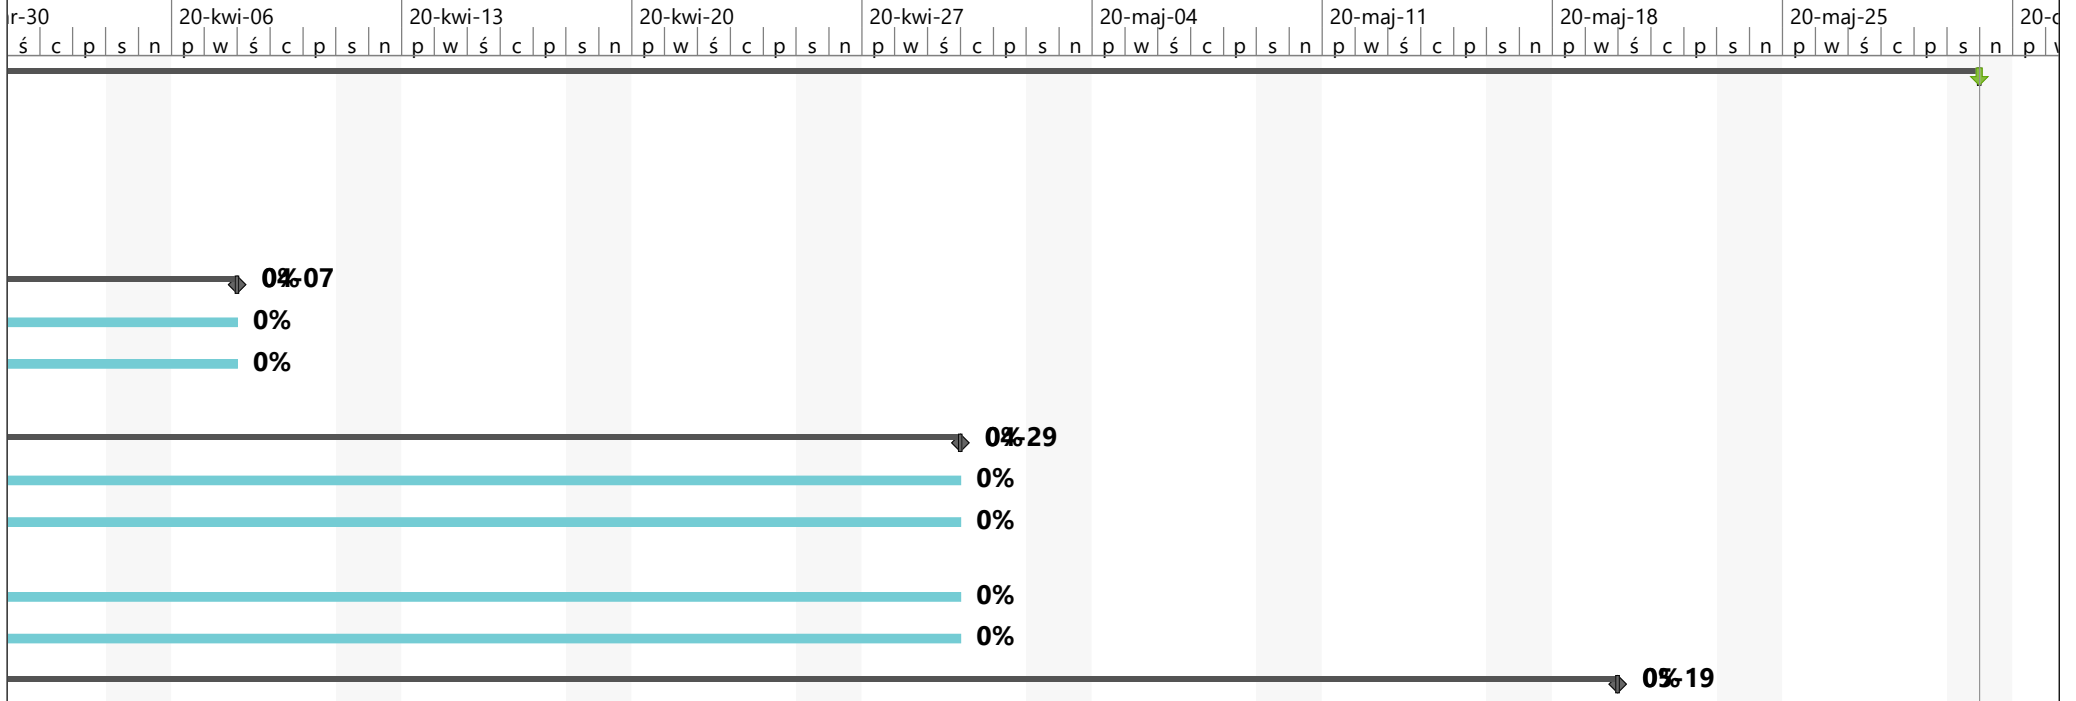

Krytyczne		Punkt kontrolny według planu bazowego	
Podział krytyczny		Punkt kontrolny	
Postęp krytyczny		Postęp sumaryczny	
Zadanie		Podsumowanie	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Postęp zadania		Podsumowanie projektu	
Zadanie ręczne		Zadania zewnętrzne	
Tylko z rozpoczęciem		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Tylko z zakończeniem		Zadanie nieaktywne	
Tylko z czasem trwania		Nieaktywny punkt kontrolny	
Plan bazowy		Podsumowanie nieaktywne	
Podział według planu bazowego		Termin ostateczny	

Załącznik Nr II.1 - Harmonogram.mpp



Krytyczne		Punkt kontrolny według planu bazowego	
Podział krytyczny		Punkt kontrolny	
Postęp krytyczny		Postęp sumaryczny	
Zadanie		Podsumowanie	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Postęp zadania		Podsumowanie projektu	
Zadanie ręczne		Zadania zewnętrzne	
Tylko z rozpoczęciem		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Tylko z zakończeniem		Zadanie nieaktywne	
Tylko z czasem trwania		Nieaktywny punkt kontrolny	
Plan bazowy		Podsumowanie nieaktywne	
Podział według planu bazowego		Termin ostateczny	
